

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото Споразумение е сключено между Страните:

КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Пристанищна №22, вх.2, ет.2, идентификационен номер 1303161400049, представлявано от инж. Стоян Христов – директор на Клон - ТП Пристанище Русе, от една страна,

и

«ТИМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ» ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Русе 7013, ул. «Орлово гнездо» № 3, идентификационен номер 200005355, представлявано от Татяна Цвяткова Енчева – управител, от друга страна.

Предвид взаимното си намерение за добросъвестни двустранни контакти и оперативно взаимодействие между страните в изпълнение на Договор между страните № от 18.03.2016 г., същите се съгласяват, че това може да е свързано с необходимост от обмен на поверителна информация /ПИ/, който те приемат да извършват помежду си в съответствие с дефинициите и условията, изложени по-долу, както следва:

1. **Поверителна информация /ПИ/** ще представляват всякакви документи, спецификации, дизайни, планове, схеми, софтуер, данни, примери, прототипи, финансова, маркетингова или друга бизнес и/или техническа информация, без значение дали е написана, изказана устно или в електронен вид, която може да се предоставя от едната Страна (по-долу наричана разкриваща Страна) на другата (по-долу наричана получаваща Страна) във връзка с по-горе упоменатите контакти и преговори, и която е собствена или поверителна информация на разкриващата Страна, обозначена е като поверителна/поверителна или собствена информация, или е предоставена при условия на поверителност от разкриващата Страна.

2. Получаващата Страна се задължава за срока на горепосочения договор между страните и за период от **2 години** от датата на прекратяването му:

а) да опазва ПИ при условия на поверителност и да се отнася към нея поне със същата грижа, с каквато се отнася към собствената си информация с подобен характер;

б) да използва ПИ само за добросъвестната подготовка и преговори за евентуални бъдещи бизнес отношения между Страните /Цел на използване/;

в) да ограничи предоставянето на ПИ, получена от разкриващата Страна, до кръга на своите служители и наети лица, които са ангажирани в контактите и преговорите между Страните, и до степента, в която това е необходимо за реализация на техните непосредствени задачи свързани с Целта на използване, както и да доведе до знанието на тези лица изискванията на това Споразумение.

г) да ограничи копирането, възпроизвеждането или препредаването по какъвто и да е друг начин на ПИ сред лицата по горната подточка само до степента, в която това е необходимо за Целта на използване.

д) да не предоставя никаква част от получената ПИ на трета страна без предварителното писмено съгласие на разкриващата Страна.

3. Разкриваната ПИ ще остане изцяло собствена и поверителна информация на разкриващата Страна. При поискване от разкриващата Страна и по нейните указания, ПИ ще бъде изцяло унищожена или върната на разкриващата Страна, включително всички копия, фотографии, твърди дискове или други носители за съхраняване на информация и всякакви дубликати, направени от получаващата Страна.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

4. Ограниченията за използване или разкриване на ПИ по Споразумението няма да се прилагат за информация, която:

а) след сключване на Споразумението е станала обществено известна или достъпна без това да е свързано с нарушение на Споразумението от получаващата Страна; или

б) към момента на разкриването ѝ вече е била известна на получаващата Страна, без това да е свързано с нарушение на настоящото Споразумение или на закона;

в) която е независимо открита от получаващата Страна, или бъде получена законно от друг източник, имащ право да дава такава информация; или

г) която разкриващата Страна се съгласява писмено да освободи от такива ограничения; или

е) която подлежи на разкриване на основание на нормативен акт или друг задължителен акт на компетентен държавен или надлежно оторизиран орган, вкл. на съд или арбитраж със съответната компетентност.

5. Нищо в това Споразумение не задължава която и да е от Страните да води преговори, да предоставя определена информация или да установи обсъжданите бизнес отношения с другата Страна.

6. Публикуването на новини, официални изявления, реклами или обяви от която и да е от Страните, засягащи това Споразумение, трябва да бъдат предварително съгласувани между Страните и одобрени в писмен вид.

7. Изменения и допълнения на това Споразумение ще бъдат валидни само ако са направени писмено и са подписани от всяка от Страните чрез техните законни или упълномощени представители.

8. Това Споразумение се сключва за срок от **2 години** след изтичане на горепосочения договор между страните и влиза в сила от датата, на която е подписано от двете Страни. То може да бъде прекратено и преди изтичането на 2-годишния срок по взаимно писмено съгласие между Страните.

9. За всички права и задължения по това Споразумение, както и за неуредените в него въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско право.

10. Всякакви спорове, несъгласия или оплаквания, възникнали по повод на това Споразумение, които не са били разрешени между Страните в дух на разбирателство за период от 30 дни, ще бъдат отнесени към компетентния български съд.

Споразумението се подписва в два екземпляра, по един за всяка от Страните.

Клон - ТП Пристанище Русе

ДП Пристанищна инфраструктура

18.03.2016г.

Дата

Подпис



„Тим Билдинг Кънстракшън
Къмпани“ ЕООД

18.03.2016

Дата

Подпис



ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. СТОЯН ХРИСТОВ
ДИРЕКТОР НА
КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ



ОБЕКТ: "Ремонт и рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток"

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

I. Обща част

Пристанище Русе-изток е въведено в експлоатация през 1974 г. Обслужването на склада за вносно-износни товари (Мархи) с железопътен транспорт се осъществява чрез изградените западно от него железопътен коловоз и товаро-разтоварна рампа. Подходите към жп разтоварището са със широчина 6 м и са частично изградени от армиран бетон. Настилките в междурелсието са от стоманобетонени плочи.

II. Съществуващо положение

Вследствие на дългогодишната експлоатация, подходите и настилките в междурелсието са разбити. Образували са се дълбоки дупки, които възпрепятстват преминаването на ППС. Плочите на настилките в междурелсието са разместени и липсват очертани жлебове.

Повишеният товарооборот на пристанищен терминал Русе - изток и най-вече на пакетирани насипни товари, доведе до недостиг на складови площи. За по-бързото обработване на товарите, е необходимо да се създаде възможност от железопътната рампа да се обслужват освен жп вагони и тежкотоварни автомобили. Това налага да се извърши рехабилитация на подхода към жп разтоварището и бетоновата настилка върху железния път.

III. Технически и други изисквания при изпълнение на поръчката

Изпълнението на обекта да се осъществи по указания, дадени от Възложителя.

По архивни документи и направени шурфове се констатира, че земната основа е от пясък и речна баластра с мощност от 1,5 до 2,5 метра с деформационен еластичен модул $E_0=(60 \div 120)$ МПа, ъгъл на вътрешно триене $\rho=27^\circ$ до 32° . Земната основа частично е уплътнявана при изграждането на склада за вносно-износни товари.

Подходът към разтоварището е разположен западно от рампения коловоз и обхваща площ от 1220 m^2 . Площта на стоманобетоновите плочи върху железопътния коловоз е 560 m^2 .

Стоманобетоновата настилка на подхода да се изгради на полета от бетонени плочи, максимално унифицирани. Настилката да се изпълни с напречен наклон 1% в посока на монтираните тротоарни бордюри. В надлъжна посока настилката следва наклона на рампения коловоз.

Дилатационните фуги са 2 см през 16 метра, а всички други напречни и надлъжни са допирни. Дилатационните фуги да се запълнят с асфалтов мъстик по рецепта.

За подосновен пласт е предвидена 20 см трошенокаменна настилка.

След изнасяне на излишния насипен материал, съществуващият да се подравни до проектната кота с булдозер. Преди полагането на трошенокаменната основа е необходимо теренът да се уплътни до достигането на деформационен модул $E \geq 60$ МРа. При недостигане на показателя за уплътняване, валирането да се повтори и ако отново не се достигне необходимата плътност, трябва да се подобри земната основа с трошен камък в съотношение 3:1 и последващо валиране.

След насипването, разриването и валирането, трошенокаменната настилка трябва да е с дебелина 20 см и уплътнена до $E \geq 200$ МРа.

Контролът за постигане на необходимата плътност е лабораторен и се отнася до :

- Зърнометричен състав;
- Максимални и минимални обемни плътности на скелета и оптималното водно съдържание по метода на Проктор/БДС 17146-90/;
- Изчисления на коефициента на порите и относителната плътност i_D

Върху трошенокаменната основа да се положи полиетиленово фолио с коефициент на застъпване $K=1,20$.

Полагане на бетоновата настилка:

Бетоновата настилка да се изпълни с дебелина 20 см. с бетон В30. Армировката да се изпълни с двойна мрежа от Ст. АIII № 12 и каре 15/15 сантиметра. Между двете мрежи да са поставени по три броя армировъчни столчета на квадратен метър, изработени от стомана с $\varnothing 10$.

Полагането на бетон се разрешава след приемането от Възложителя на подосновните пластове. Входящият контрол на всички материали за бетона ще се извършва от строителната лаборатория на бетоновия център. Доказването на качеството на бетона ще се извършва от независима строителна лаборатория, съгласно БДС-9673 - на 28-я ден.

За бетона се изисква да се провери и на мразоустойчивост по БДС. Бетонните смеси се произвеждат и контролират по следните стандарти по БДС - 505, 4718, 7268, 9673, 7269, 7016.

При полагането на бетона трябва да се избегне разслояването на материалите и изместването на армировката и кофража. Покрай прясно положен бетон да се избягват уплътнителни и вибрационни работи, които могат да го увредят трайно.

Вибрирането на бетона продължава до тогава, докато от бетона престанат да излизат въздушни мехурчета.

Незабавно след уплътняването, заглаждането на повърхността на бетона и неговото втвърдяване се вземат мерки за предотвратяване съсъхването и напукването - при летен сезон, в случая се покрива с полиетилен, зебло или друг материал, който да запази влагата. Преди втвърдяването на положения бетон да се избягват в близост уплътнителни и вибрационни работи, които могат да доведат до трайното му увреждане.

Направата на настилката върху железния път да се извърши от армиран стоманобетон, като се ползва бетон клас В-30 и профилна стомана Ст.АIII. Оформянето на горния ръб и очертаването на външните размери да се направи със стоманен ъглов профил 50/50/5, заварен към армировката шахматно през 20 см. Широчината на улея (жлеба) между вътрешната страна на релсите и прелезната настилка в междурелсието да е 80 мм, а дълбочината да е най-малко 45мм. Краищата на настилката в междурелсието извън платното за движение да се извият навътре с 25 см по протежение 0,50 м. Горната повърхност на настилката да е наравно с горната повърхност на релсите. За изравняване нивото на настилката с горната повърхност на релсите между плочите и баластовата призма/траверсите да се положи уплътнена пясъчна „възглавница” със средна дебелина 5см и относително плътност $\geq 0,70$.

Всички СМР в очертаванията на строителния габарит на жп коловоза да се извършат съгласувано с представителя на ДП „НКЖИ“ за пристанищния терминал, при спазване на всички нормативни изисквания.

Изпълнителят на обекта следва да има актуална регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.

Изпълнителят на обекта следва да разполага със специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав), с необходимата професионална квалификация за видовете работи, които следва да се извършат, с професионална квалификация и професионален опит в извършването на еднакви или сходни с предмета на поръчката работи.

Изпълнителят на обекта следва да разполага със собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване (строителна техника и механизация), с технически характеристики, необходими за изпълнение на поръчката.

При изпълнение на обекта, изпълнителят трябва да използва материали и изделия, които отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда на наредбата.

След приключване на СМР изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Гаранционен срок на изпълнените СМР — гаранционният срок ще се определи съобразно офертата на участника, но не може да бъде по-малък от предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 12 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за вида СМР, предмет на поръчката.

При изпълнение на СМР, изпълнителят се задължава да не нарушава работния процес на пристанищния оператор и спазва пропускателния режим и правилата за вътрешен ред в пристанищния терминал.

Предвидените за изпълнение строителни и ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.


В процеса на изпълнение Възложителят може да заменя количества от един вид договорена работа с количества от друг вид договорена работа, с цел предаване на обекта в завършен вид.

Приложения:

- Ситуация на обекта;
- Армировъчен и кофражен план на външни плочи върху железен път;
- Армировъчен и кофражен план на вътрешни плочи върху железен път;
- Детайл на монтаж на стоманобетонени плочи върху железен път.


Изготвил:

/инж. Маргарит Бакърджиев/



СИТУАЦИЯ

НА ЖП РАЗТОВАРИЩЕ В ПРИСТАНИЩЕН
ТЕРМИНАЛ Русе-изток

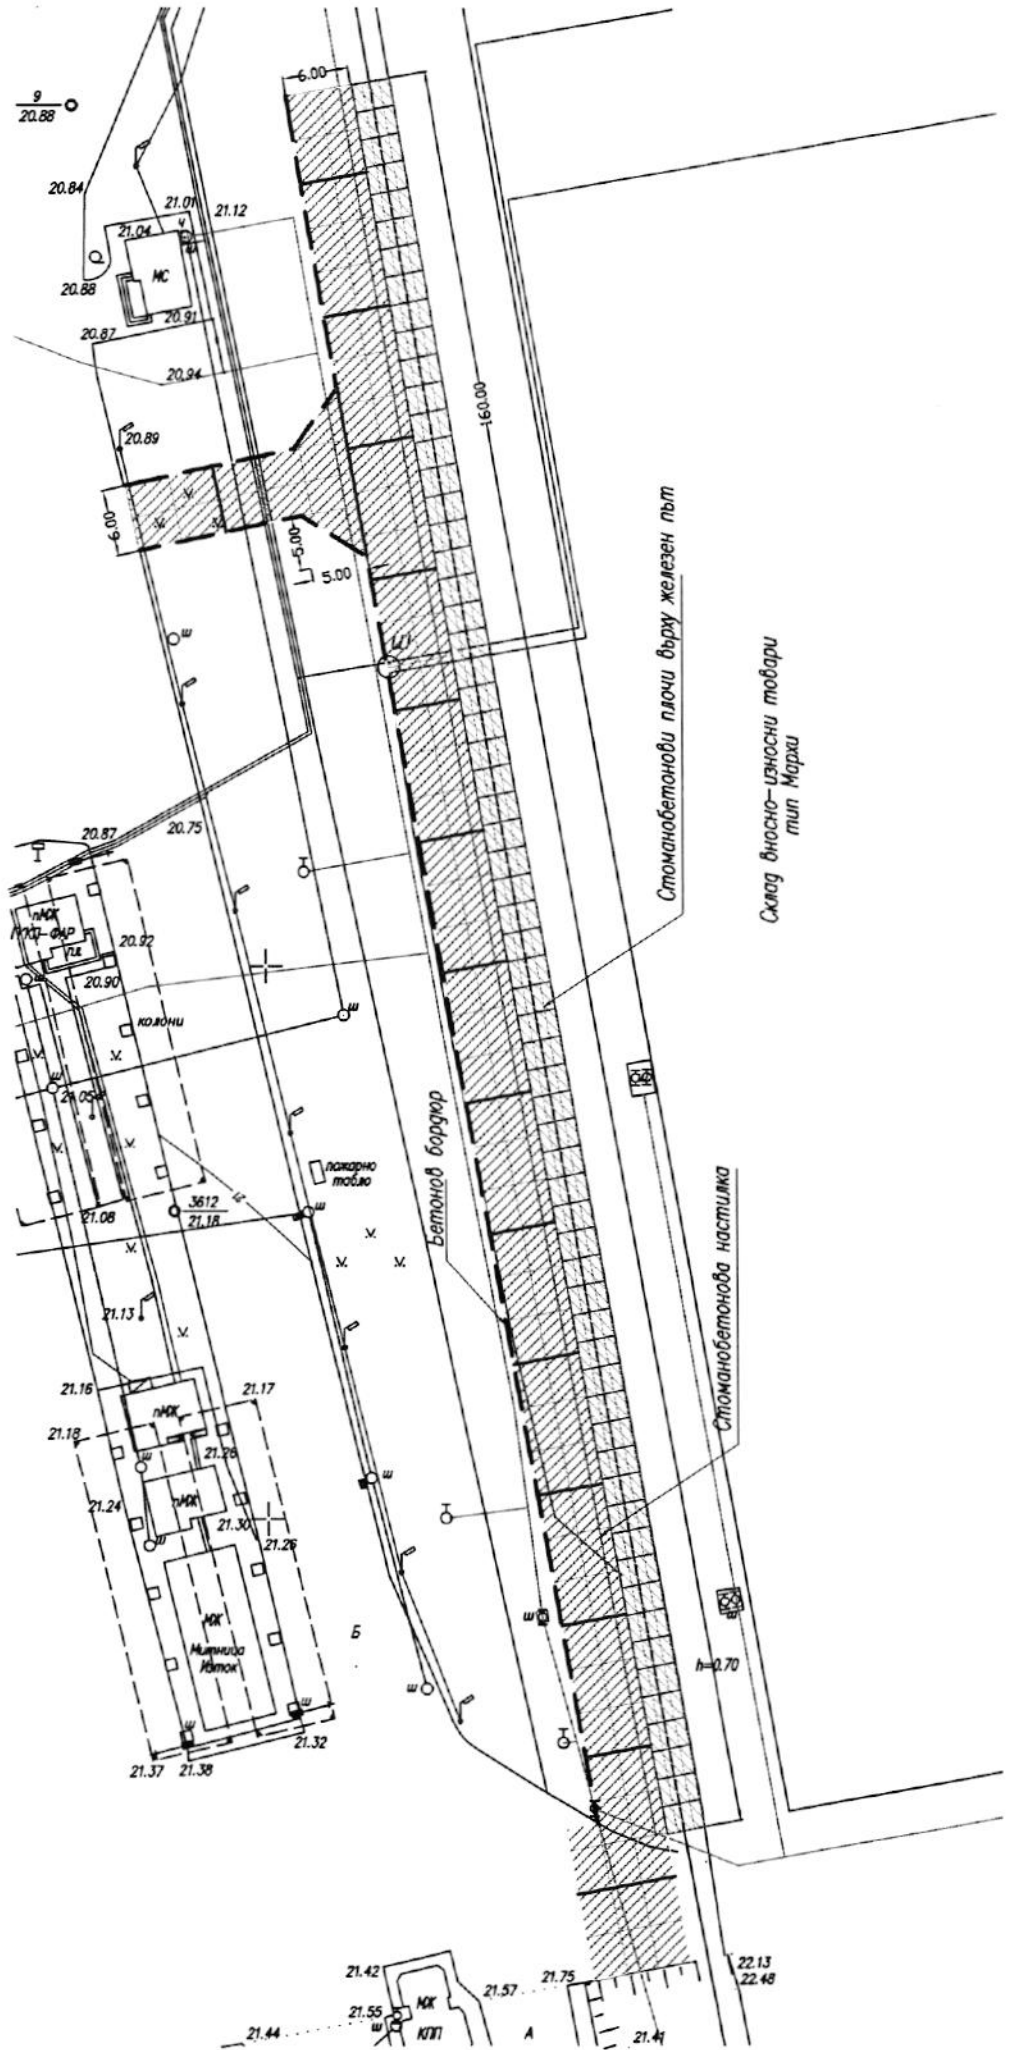

Стоманобетонни плочи върху железен път

Склад вносно-износни товари
тип Марха


Бетонен бордюр

Стоманобетонна настилка


h=0.70

21.42 21.55 21.57 21.75 22.13 22.48
МК КТТ А 21.41

АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН ВЪНШНА ПЛОЧА

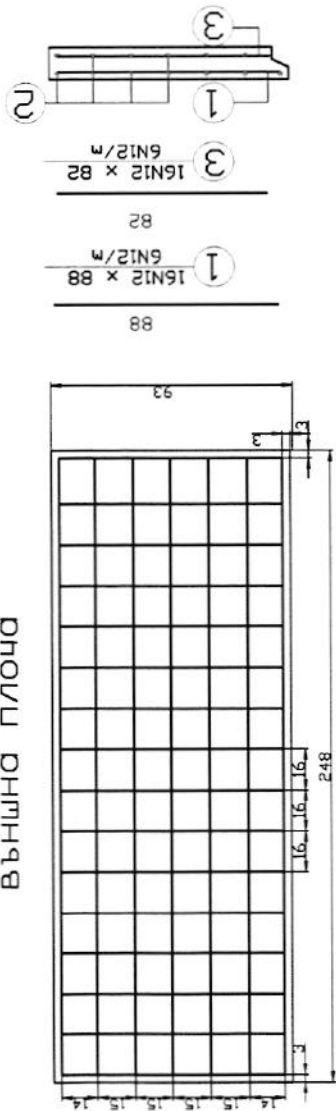

② 13 N 12 x 242
6N12/m



5
10
10

④ столцета 10ø10 x 35

Материали за 1 бр. плоча


- BM30 - 0,30м³
- СТ.А-I - 1,30кг
- СТ.А-II - 52,11кг
- Тегло - 594кг

Спецификация на
армировката за 1 брой
плоча

N	Ø (mm)	Един. дълж. (м')	Брой	Дължина по диаметри (м)		
				A I	A III	
1	N12	0.88	16	—	14.10	
2	N12	2.42	13	—	31.46	
3	N12	0.82	16	—	13.12	
4	Ø10	0.35	6	2.10	—	
Общи дължини по диаметри				2.10	58.68	0.00
Тегло по диаметри (kg/m)				0.617	0.888	0.00
Тегло по диаметри (kg)				1.30	52.11	0.00
Тегло по класове				1.30	52.11	—
Общо тегло (kg)				—		53.41

КОФРАЖЕН ПЛАН ВЪНШНА ПЛОЧА


Разрез 2 : 2

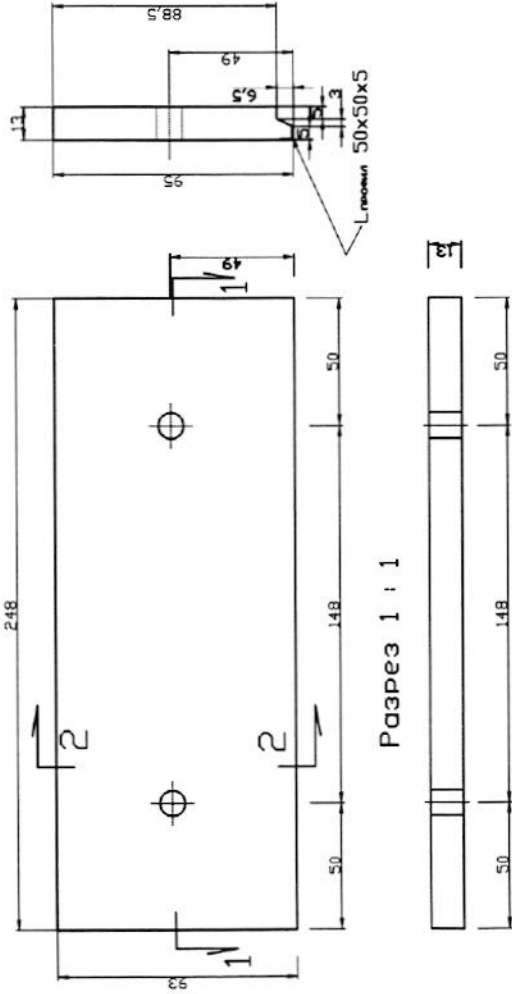



Разрез 1 : 1

АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН ВЪТРЕШНА ПЛОЧА

Долна
армировка

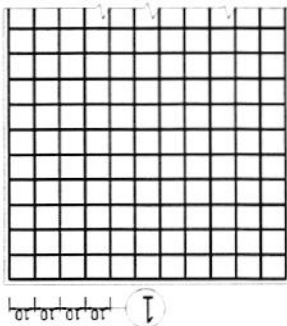

Горна
армировка

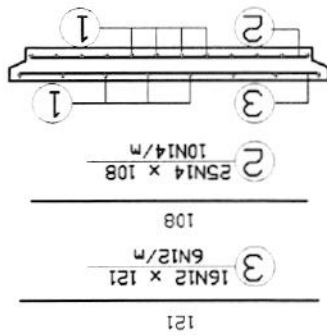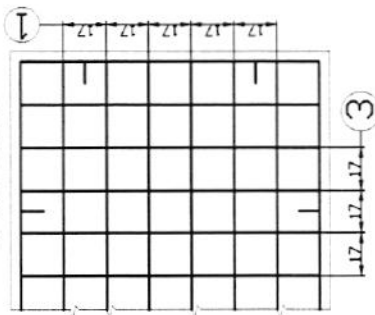

Материали за 1 бр. плоча

BM30 - 0,39 м³
 СТА-I - 2,14 кг
 СТА-III - 92,83 кг
 Тегло - 798кг

Спецификация на армировката
за 1 броя плоча

N	φ (mm)	Един. дълж. (м')	Брой	Дължина по диаметри (м)		
				A I	A III	A III
1	N12	2.42	20	—	48.40	—
2	N14	1.08	25	—	—	27.00
3	N12	1.21	16	—	19.40	—
4	φ10	0.35	10	3.50	—	—
Общи дължини по диаметри				3.50	67.80	27.00
Тегло по диаметри (кг/м)				0.617	0.888	1.208
Тегло по диаметри (кг)				2.14	60.21	32.62
Тегло по класове				2.14	92.83	—
Общо тегло (кг)				94.94		

5
10


4 столчета 10φ10 x 35

242 горна


1 8 N 12 x 242
6N12/м

242 долна


1 12 N 12 x 242
10N12/м



КОФРАЖЕН ПЛАН ВЪТРЕШНА ПЛОЧА

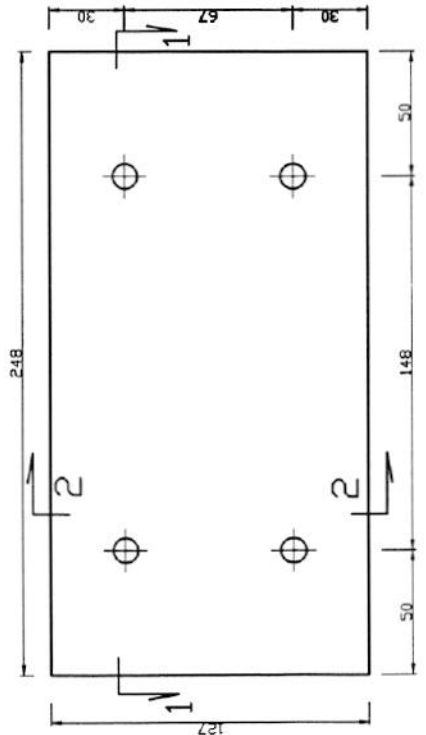


Разрез 2 : 2

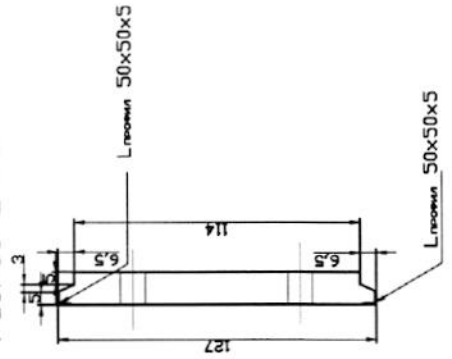

Разрез 1 : 1



ДЕТАЛ
НА МОНТИРАНЕ НА СТ. БЕТОНОВИ
ПЛОЧИ
НАД ТРАБЕРСА

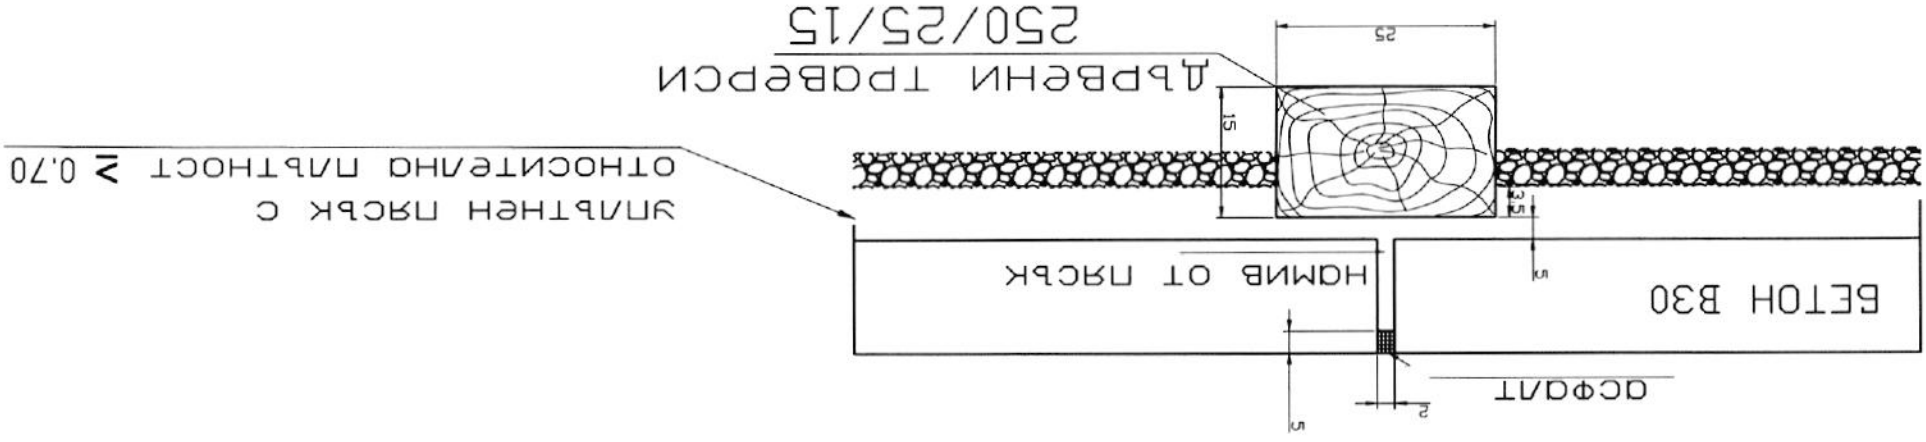

ЗАБЕЛЕЖКА: ДЕТАЛЪТ Е ОЧАКОВАНЕН В СЛУЧАИ
НА БЕТОНОВИ ИЛИ СТЪЛБОВЕТОЧНИ
ТРАБЕРСИ

ДО
ИНЖ. СТОЯН ХРИСТОВ
КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава 8А във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: "Ремонт и рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток"

От Татяна Цвяткова Енчева, ЕГН 7501285378, притежаваща л.к.№ 640554302, издадена на 1.08.2010 г. от МВР гр.Русе (орган и място на издаването), в качеството си на Управител (длъжност) на „Тим Билдинг Кънстракшън Къмпани“ ЕООД (наименование на участника), ЕИК 200005355, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул. „Орлово гнездо“ №3, бл. „Лебед“, ет.1, тел.0888521374

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

След запознаване с публичната покана и документацията за участие в обществената поръчка с предмет: *"Ремонт и рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток"* изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето **Техническо предложение** за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР на обекта (обяснителна записка).
2. Подробен линеен график, за изпълнение на обекта.
3. Описание на мерките за опазване на околната среда, които ще бъдат приложени при изпълнение на поръчката.
4. Предлагаме да изпълним обществената поръчка в срок от 72 (*седемдесет и два*) календарни дни¹ от подписването на протокол за осигуряване на достъп и предаване на строителната площадка на изпълнителя, но не по-късно от 10 (десет) дни след подписване на договора.
5. Предлагаме гаранционен срок за обекта: 8 (осем) години. Предложеният от нас гаранционен срок е съобразен с Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация

¹ Срокът не може да бъде по-дълъг от 90 календарни дни

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


6. Прилагаме декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП *(по преценка на всеки участник и при наличие на основание за това)*.

Приложения: съгласно текста.

29.02.2016 г.
(дата (дд/мм/гггг))

гр. Русе

Татяна Енчева – Управител
(име и фамилия/ длъжност)



.....
подпис на законния представител или
на надлежно упълномощено лице,
което подава офертата (и печат)

Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР на обекта Обяснителна записка

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

При откриване на строителната площадка ще се постави Информационна табела, която ще бъде поставена на видно място на строителната площадка и ще съдържа:

- дата на откриване на строителната площадка;
- възложител / име и адрес/;
- вид на строежа;
- координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа /име и адрес/;
- планирана дата за започване на работата на строителната площадка;
- планирана продължителност на работа на строителната площадка;
- планиран максимален брой работещи на строителната площадка, съгласно линеен график;
- планиран брой строители и лица самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

Преди откриването на строителната площадка възложителят или упълномощено от него лице е длъжен да гарантира чрез оценка за съответствие по реда на ЗУТ, че:

- с техническото задание за строежа са спазени изискванията за безопасност за всички етапи на строителството и че всички инсталации /водопровод, енергоносители, и други продуктопроводи, канали и т.н./ попадащи в зоната на строителната площадка са ясно означени в ситуацията;
- всякакви други промени ще бъдат съгласувани по съответния ред, без да бъдат нарушавани изискванията за ЗУТ.

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на работата строителят е длъжен да извършва оценка на риска:

- оценката на риска обхваща всички етапи на строителство, изборът на работно оборудване и всички параметри на работната среда;
- оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители и се актуализира при включване на нови в процеса на работа;
- ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира;
- строителят осигурява изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискваните по Наредба №2 случаи;
- изборът на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях, и определянето на транспортни пътища;
- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба, и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове;
- инструктажът срещу подпис и проверката на знанията по безопасни условия на труд на работещите;
- картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване /електрическите, транспортните средства и др./ и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;

- разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено ако това се отнася за опасни материали и вещества /при необходимост от използването им/;
- изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
- адаптирането на стаята и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на работите на строежа;
- по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;
- организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;
- писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица /техническите ръководители, бригадирите и др./ и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес, и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси;
- утвърждава организационната схема за взаимоотношенията между тях;
- предприема допълнителни мерки за защита на работещите на работните места при неблагоприятни климатични условия;
- определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствие, авария и пожар, и за евакуация.

Инструкциите по безопасност и здраве съдържат:

- правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси;
- изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определените строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти;
- изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, а именно:
- преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работа;
- за използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;
- при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологичното оборудване и инсталации;
- средствата за колективна защита и на личните средства, като се дава предимство на колективните пред личните;
- условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ при злополука и др.;
- схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и на местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на словесните съобщения, които при необходимост се подават при работа.

Инструкциите по безопасност и здраве се поставят на достъпни и видни места в работната зона, актуализират се при всяка промяна и съдържат датите на които са утвърдени и изменени.

Последователност и взаимнообвързаност на предлаганите дейности.

Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, заваръчни и други инструменти задължително трябва:

да спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и изискванията на Наредбата за съответната машина или инструмент;

преди започване на работа да проверяват изправността на машините и инструментите, а по време на работа следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват работа;

при съвместна работа със сигналист точно да изпълняват подаваните сигнали;

да изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие – на заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация на машината.

При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират срещу подпис за задълженията им да:

спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;

е явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества;

спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;

не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;

използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място;

преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат, че са създадени условия, застрашаващи тяхното здраве или живота им, така и здравето и живота на околните лица, както и когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив;

използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества, и другите средства за работа, както и да не използват неизправни такива;

не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите.

При изкопни работи се предприемат мерки за безопасност, които включват:

предварително установяване и съответно минимизиране на опасностите от подземни мрежи и съоръжения;

извеждане на работещите на безопасно място в случай на пожар, авария, или наводняване.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия - гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, гъста мъгла.

Издигането и свалянето на всякакъв вид товари се извършват предимно по механизирани начин, като не се допуска хвърляне или ръчно подаване от ръка на ръка с помощта на въжета, телове и др.

Строителните машини, които работят или ще работят на строителната площадка трябва да:

отговарят на изискванията на възложителя за извършване на предвидените СМР;

са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обследване, и да са безопасни за използване.

Продуктите машините и съоръженията, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат;

За предотвратяване и бързо ликвидиране на пожари и аварии, и за бърза евакуация на работещите на строителната площадка е необходимо:

на видни и достъпни места в работните зони и на строителната площадка да се поставят табели със: телефонния номер на службата за противопожарна и аварийна безопасност; адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;

в помещенията от временното строителство, както и на открити и видни места на територията на строителната площадка, с указателни знаци да бъде указан пътя за евакуация на работниците;

да бъде инсталирано противопожарно табло с брадва, кирка, лопата, конопено въже 20м, метална кофа, сандък с пясък, оцветени в ярко червен цвят;

по време на инструктажа на работниците, който задължително трябва да се проведе срещу подпис, да се укаже на работниците местоположението на противопожарното табло;

да не се допуска тютюнопушене и паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта от денонощието, на места, категоризирани или определени като "пожаро - или взривоопасни".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДВИЖДАНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СЪОБРАЗНО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ)

Видове работи:

За изграждането на обекта е необходимо да се изпълнят видовете работи, съгласно количествени сметки:

№	Видове работи	Ед. мярка	Количество
1	Демонтаж на ст.б. плочи от временен преход и стифиране на фигура за повторна употреба	бр.	8.00
2	Изсичане и разкрояване на единични дървета и дънери на храсти над 10 см	бр.	5.00
3	Механизирано изкореняване на дънери и натоварване на транспорт	бр.	5.00
4	Разкопаване и натоварване отпадъци на транспорт с багер	м ³	85.00
5	Тънък изкоп с багер на транспорт	м ³	462.00
6	Извозване на земни маси и отпадъци до 10 км разстояние в т. ч. и такса сметище	курс	82.00
7	Подравняване на земната основа с булдозер	м ²	1320.00
8	Валиране на земната основа с вибровалък до E≥60 МРа или I _D = 0.7	м ²	1320.00
9	Преработка на съществуваща шахта	бр.	1.00
10	Доставка на трошен камък 5-75 мм до 80 км с включен транспорт	м ³	264.00
11	Разриване на трошен камък за пласт от 20 см с булдозер	м ³	264.00
12	Валиране с вибровалък до E≥200 МРа	м ³	264.00

13	Полагане на полиетиленово фолио със застъпване K=1,20	м ²	1464.00
14	Армировъчни столчета ф10 х40 х 3бр/м ²	кг	1807.00
15	Доставка и монтаж на армировка Ст.АІІІ за плочи (N12 на карета 15/15 см)	кг	28731.00
16	Доставка и полагане на бетон В 30 за плочи 3.00/4,00/0.20 с долна и горна армировка N12 на карета 15/15 см	м ³	244.00
17	Стиропор 2см за фуга	м ²	14.40
18	Кофраж за бетонови настилки	м ²	148.00
19	Битумна заливка за дилатационни фуги	м ³	0.970
20	Доставка и монтаж на видими бетонови бордюри 18/35/50	м	202.00
21	Доставка и полагане на подложен бетон за бордюри В7.5	м ³	5.90
22	Направа и монтаж вътрешни плочи 147/248/13 (двойно армирани и с усилени ръбове) върху пясъчен слой	бр.	64.00
23	Направа и монтаж външни плочи 95/248/13 (двойно армирани и с усилени ръбове) върху пясъчен слой	бр.	128.00
24	Направа пясъчен слой (пясъчен налив) под плочи върху железен път	м ³	56.00

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТИ

Комплексен линеен график за последователността на извършване на СМР:
Изготвен е подробен линеен график за последователността на извършване на СМР в рамките на предвиденото време за строителство. Всички видове работи, са съобразени със спецификата на обекта.

Ще се извършат следните технологични процеси:

1. Трасиране на предвидените наклони за основните елементи, като се има предвид съществуващото положение и не се допуска да се получават резки преходи в оперативната зона и връзката между настилките. Успоредно с тази дейност, за собствена сметка, ако бъдем избрани за изпълнител на горе-цитираната поръчка ще предприемем мерки за ограничаване рисковете, анализ на пресечните точки с оператора на терминала и строителните дейности.

2 Изпълнението на обекта ще се осъществи по указания дадени от Възложителя, ако след направените измервания се установят разлики в нивата, неблагоприятстващи правилното водооттичане на площадката, или елементи от нея, ще се подпише двустранен протокол с траситовъчни коти.

3 Фактическите дейности ще започнат с разчистване на площадката от ненужната растителност, отстраняване на ненужни елементи, депонитането и стифирането им. Предвид дейността на терминала, ще се предприемат мерки за недопускане забавяне в графика. Разполагаме с два пъти необходимата механизация за извършването на

дейностите. След прилагане на временна организация за движение в терминала, ще се съгласува подходящо място за депониране на инертни материали.

4 Дейностите по изкопни работи са предвидени да започнат на четвъртия календарен ден от подписването на протокол за предаване на площадката. Предвидили сме работа с много динамична техника, предвид дебелината на изкопа. Съгласно архивната документация, предоставена от Възложителя земната основа е от пясък и речна баластра. Това обстоятелство предполага приключване на изкопите в срок до пет календарни дни от започване на изкопите.

5 След определяне на нивата ще се премине към преработка на съществуващите шахти, с цел да съвпаднат с предвидените настилки. След демонтажа на преходните капаци, ще се преизчисли съгласно гривните и ще се фиксират трайно. Предвидено е подмазване на шахтите, за наша сметка с цел да се удължи значително експлоатационния период на съоръженията.

6 След приемане на земната основа от Възложителя, съгласно изискванията на Техническото задание за достигане на еластичен модул и коти ще се премие към насип и уплътняване на трошено каменната фракция, като ще се обърне специално внимание на елементите труднодостъпни с вибрационния валак.

7. Предвижда се доставка и монтаж на видими бетонови бордюри, положени на бетон В 7,5, с които да се оформи площадката и ще се ограничи потока на атмосферните води. След втвърдяването на сместа и трасиране на наклоните ще се положи полиетиленово фолио, ще се положи предвидената долна армировъчна скара и ще се бетонира, на карета с шахматен такт план, като оформянето на дилатационната фуга се предвижда да се изпълни със EPS на 2 см.

8. Площите ще се армират с двойна скара от желязо N12 на карета 15/15 съгласно Техническото задание на Възложителя. С цел да се предотврати изтичането на циментовото мляко от бетоновата смес е предвидено полагане на полиетиленово фолио преди арматурата. Предвидено да се положи бетон В30, с което ще се подсили товароносимост на настилката. С цел да се фиксира разстоянието между скарите от арматурно желязо е необходимо да се изработят и монтират армировъчни столчета.

9. Направата на настилка върху железния път ще се реализира от предварително изработени панели съгласно приложената от Възложителя в Техническото задание спецификация и графични материали, като за целта ще се използват стоманени кофражи за фиксирание на закладните части и технически шпертпалат. Предвид степента на точност този метод е най-подходящ. Той гарантира минимална възможност за допускане на грешки от сторителните работници. След добиване на критична якост елементите ще бъдат монтирани на предварително подготвена пясъчна възглавница

10. Обработката на дилатационните фуги ще се реализира с битумна заливка (мъстик).

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА ШЕ СЕ СПАЗВАТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПИПСМР И ДП „НКЖИ“, НЯМА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ В ПРОТИВОРЕЧИЕ НА ПРАВИЛНИКА. ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ШЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ШЕ БЪДАТ СЪГЛАСУВАНИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ОПЕРАТОРА НА ТЕРМИНАЛА.

ТРУДОВИ РЕСУРСИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

При изготвянето на плана за изпълнение на обекта, с оглед на минимизиране на срока за изпълнение е използван смесеният метод на планиране. Той притежава предимствата и на успоредния и последователен методи, и затова е получил най-широко приложение в строителната практика.

Поточният метод на организация на строителството е една разновидност на смесения метод, т.е. той е смесен метод, при който изпълнението на отделните работи е точно фиксирано в пространството и времето и подчинено на основни принципи. Той се основава на равномерното и непрекъснато осъществяване на технологическия процес, свързано с равномерното използване на производствената мощност и ресурсите на сдружението ни с равномерното завършване и пускане в експлоатация на дадения обект.

Организационно технически мероприятия:

I. Организация на строителната площадка

На строителната площадка ще се доставят за наша сметка:

Фургон за техническия персонал - 1бр;

Покрит метален склад - 1бр.

Химическа тоалетна – 1 бр.

Знаци – пътеуказатели – 11 бр.

Предпазни решетки – 4 бр.

Светлинни указатели – 6 бр.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И ДРУГИ

ОБОСНОВКА

1. Определяне на трудоемкостта

Норма време (Нвр.) - количеството труд, изразено в ч.ч., необходимо и достатъчно, за да се произведе единица доброкачествена продукция с определено качество от един или група работници, работещи в условията на нормалата на процеса (индивидуална, зенова форма)

Трудоемкост - количеството труд, необходим, за да се произведе определено количество продукция с определено качество.

2. Линеен календарен график - изчисления

Срокът и времетраенето за извършване на всяка работа се отразява графично в календарния план. Определят се и се нанасят календарните дни, които се получават от работните умножени с коефициент 1.36 (съотношение на работните към почивните дни и дните, в които не може да се работи по обективни причини от една календарна година).

За да се следи ежедневно общото количество на работниците, заети в строителството на разглеждания обект, под календарния ни план е изчертана диференциална диаграма на работната ръка.

Оптималността на календарния план се определя по диаграмата за движение на работната ръка.

Допълнителни мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

След подписване на договора за строителство ще се подпише тристранно споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. В него конкретно ще бъдат записани задълженията на всяка от страните за осигуряване безопасността на ученици, служители и работници.

Обекта ежеседмично ще се контролира от служителят на фирмата, отговарящ за организиране и координацията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Преди да започне работата на обекта ще бъде обезопасен от достъпа на външни лица.

Всички работници ще бъдат ежеседмично инструктирани за безопасни методи на работа и ще имат лични предпазни средства в съответствие с изпълняваната дейност.

При започване на работа, на обекта ще се оборудва противопожарно табло.

Ежеседмично ще се провеждат оперативки с възложителя и/или с оператора на терминала.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Мисията ни, е да осигурим на своите потребители продукти с високо качество, които да задоволяват техните потребности за сигурно и комфортно живеене и работа.

Дружеството се стреми към непрестанен растеж като изгражда взаимноизгодно сътрудничество с бизнес-партньори и насърчава и подкрепя професионалното развитие на своите сътрудници.

Всички процеси в нашата организация последователно са ориентирани към качество, здраве и безопасност при работа (ЗБР). Основание за това са:

- невъзможността за достъп и успех в условията на пазарна икономика без наличието на интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността,
- възможността за ефективно осъществяване на отделните процеси с оглед на адаптиране към изискванията на пазари и клиентите, оптимизиране на разходите и подобряване на качеството,
- създаването на условия за съпричастност и ангажиране на всеки сътрудник за качествена и безопасна работа, утвърждаване и просперитет на предприятието,
- уважението и коректното отношение към клиентите.
- спазването на приложимите нормативни и други изисквания и собственото ангажиране за
 - опазващо здравето на работещите и клиентите закупуване, съхранение, продажби и извършване на услуги,
 - предотвратяване на инциденти и злополуки чрез активно вземане на мерки
 - предпазване на сътрудниците от увреждане на здравето им,
 - информиране
- измеримостта и достоверността на безопасността на труда чрез
 - откритата комуникация на всички равнища,
 - кооперативното сътрудничество с държавната и общинската администрация,
 - активното и съзнателно участие на сътрудниците при осъществяването на тази политика, опазването на собственото здраве и това на другите, както и в повишаването на квалификацията си.
- изискванията към външни работодатели, чийто персонал извършва работи и дейности на територията на нашето предприятие, за спазване нормите за безопасност на труда,
- разбирането, че качеството, здравето и безопасността на труда са
 - инвестиция в бъдещето на предприятието,
 - принос за опазването на живота,
- признанието, че дейността по осигуряване на здравето и безопасността при работа е интегрална част от всички дейности изпълнявани в дружеството,

- отношението към управлението на ЗБР, като първостепенна отговорност на всички ръководители отгоре до долу.

Следвайки нашата философия ние си поставяме и други цели:

- да заемем на строителния пазар като признати специалисти стабилна позиция като сигурни и качествени доставчици и изпълнители,
- да постигнем голяма удовлетвореност на клиентите чрез трайно възпроизводимо качество, спазване на сроковете и сигурност,
- да се стремим към постоянно подобрене на процесите,
- да гарантираме пълната прозрачност и проследимост на процесите и продуктите,
- да изграждаме система за развитие на творческата активност от откриване на грешките към предотвратяването им,
- да управляваме процесите и ръководим персонала целево ориентирано и да оценяваме и преглеждаме изпълнението на целите веднъж годишно,
- да гарантираме безопасна работа на персонала и съоръженията,
- да осигуряваме активно участие на работниците и служителите и постигане на убеденост в политиката и нейното прилагане,
- осигуряването на адекватни ресурси за осъществяване целите на политиката
- да организираме информирането, обучението и инструктажът за безопасно изпълнение на видовете дейности като постоянна практика във фирмата и превръщането ѝ в лична убеденост на персонала.

Основните процеси са разработени и внедрени в съответствие с изискванията към нашите услуги и дейности. Представеният ход на процеса и последователността на процесите важат за всички съответни услуги и дейности.

Планиране на създаването на продукта

Планирането на създаването на продукта / услугите се извършва в рамките на действащото законодателство и вътрешни нормативни актове на предприятието, както и в документи от ИС.

Договаряне (процеси, свързани с клиента)

Най-добрата възможност да се разбере какво желае клиентът е да се комуникира с него. Това и определянето на пътищата за доставяне на продукта на клиента, както и проучването на удовлетвореността му от нас, са цели на този процес. Клиентът се информира и за влиянието на нашите продукти върху ЗБР.

Закупуване

Чрез регламентиран процес на закупуване се гарантира, че закупените продукти и услуги отговарят на изискваните спецификации. Систематичният и внимателен избор на доставчиците и оценката им гарантират на нашето предприятие оптимизирано по отношение на качество, срок на доставка, цена, влияние върху ЗБР закупуване на СМС.

Производство

Чрез определени технологии, методи и дейности за планиране, подготовка и изпълнение на производството се гарантира, че процесите на обработка и изпълнение на поръчката протичат при планирани и овладени условия: качествени и проверени СМС, квалифицирани сътрудници, поддържано производствено оборудване, валидна документация, здравословни и безопасни условия на труд. Това е гаранция, че нашите продукти ще изпълнят желаните и определени изисквания към качеството и ЗБР.

Манипулиране, съхранение, опаковане, предпазване и доставка

Ние гарантираме, че влизащите и излизащите материали и продукти през вътрешното манипулиране до експедицията, съответно приемането при клиента ще се обработват правилно и безопасно за здравето. Произведеното качество се запазва и предава при пласмента на клиента, чието бързо и точно обслужване е наша основна цел.

Планиране и определяне на вредни фактори и правни изисквания

Ние гарантираме, че определяме и актуализираме вредните фактори при трудовата дейност, оценяваме риска на работните места, анализираме всички работни места и дейности, постоянно следим съответствието с правните и други изисквания при управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

Готовност за ситуации

Ние гарантираме, че поддържаме готовност за овладяване на потенциални инциденти и извънредни ситуации в безопасността на труда чрез постоянно трениране на способности за предотвратяване на инциденти и реагиране в подобни ситуации.

Оперативно управление

Ние гарантираме, че идентифицираме и планираме операциите, които са свързани с идентифицираните рискове, общите и конкретните цели по условията на труд, за да осигурим, че те се извършват при определените условия и за които ще се прилагат мерки за овладяването им

Процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Дружеството разполага с персонал и извършва всякакъв вид строително-монтажни работи със собствена строителна група.

Дружеството има лицензи по:

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008

ISO 18001:2007

Чрез прилагането на една целесъобразна за нашето предприятие интегрирана система за управление на качеството и безопасните и здравословни условия на труд ние гарантираме, че процесите и правомощията са еднозначно регламентирани, прилагани и контролирани.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

При подписване на договора за строителство ще се проведе среща заинтересованите страни. Целта ѝ ще бъде да се уточнят участъците на работа и продължителността на работа на всеки един от тях за да не се пречи на основната му дейност. Ако е необходимо, ще се направи промяна в графика на работния процес по начин, който да удовлетворява и всички страни.

Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора.

№	Възможни рискове	Превантивни мерки
1	Доставка на основни материали	Имаме сключени предварителни договори с производители и доставчици на строителни материали в областта.
2	Качество на материалите	Всички материали, влагани в строителството

		при доставка ще бъдат придружени от сертификат за качество и/или декларация за съответствие. Разполагаме със собствен бетонов възел придружен от сертификати за качество.
3	Качество на изпълнение на СМР	1.Разполагаме с необходимия опитен изпълнителски състав за изпълнение на поръчката. 2.Контрола по изпълнението на СМР ще става постоянно от техническият ръководител на обекта и ежедневно от Ръководителя на обекта. 3.Фирмите, с които имаме сключени предварителни договори за доставка на материали също ще контролират изпълнението на СМР поради факта, че гарантират дълготрайност.
4	Спазване срока на договора	1.Разполагаме необходимия брой опитен изпълнителски състав за изпълнение на поръчката. 2.Разполагаме с необходимото оборудване за изпълнение на поръчката в договорените срокове.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

При изпълнението ще имаме предвид, че е възможно да се заменят един вид работи с друг с цел да се реализира обекта, предмет на поръчката, без да се надвишава договорената сума за реализация на обекта.

Татяна Енчева – Управител
(име и фамилия, длъжност)

гр.Русе



Описание на мерките за опазване на околната среда, които ще бъдат приложени при изпълнение на поръчката

Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва и др.)

Основна цел на програмата е да се определят конкретните мерки за опазване и възстановяване на околната среда на базата на съществуващото състояние и очакваното въздействие на строително - монтажните работи.

Опазването на околната среда е свързано с:

- съхраняване на природните ресурси;
- осъществяване на строг контрол върху потенциалните източници на замърсяване на компонентите на околната среда;

Конкретните мерки, които трябва да се вземат съобразно проекта, могат да се обобщят в подпрограми.

Подпрограма “Атмосферен въздух”

да се избегне праховото замърсяване на въздуха от автомобилния транспорт и отделяне на вредни газове от строителните машини.

Подпрограма “Води”

да се избегне изтичане на вредни и отровни течности от строително - монтажни работи, от строителни машини и битови отпадни води в повърхностни и подземни водни басейни.

Подпрограма “Почви”

да се избегне замърсяване с твърди и течни замърсители от строително - монтажни работи, строителни машини и битови отпадъци

Подпрограма “Отпадъци”

ефективно управление на отпадъците , генерирани в процеса на строителството, с цел да не попадат в околното пространство

Подпрограма “Акустика на средата”

да се избегне шумовото замърсяване

Подпрограма “Радиационен фон”

да се избегне замърсяване на средата с йонизиращи лъчения

10. Мерки за предотвратяване

Атмосферен въздух

- Маршрутите, по които ще се движат транспортните коли да се подберат така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум. Целта е да се опази въздуха и човешкото здраве от замърсяване.
- Ограждане на строителната площадка за ограничаване разпространението на прах при сухо и ветровито време.
- Измиване гумите на камионите посещаващи обекта при дъждовно или влажно време.
- Да не се допуска работа на строителни машини и механизация на празен ход

- За намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали се оросява терена на строителната площадка.

Води

- Прилаганите материали, съоръжения и технологии осигуряват водоплътност на временната канализационна мрежа, като отпадъчните води се събират в резервоари за да се опази чистотата на повърхностните и подземните води.
- Инсталират се химически тоалетни.

Почви

- При необходимост - отнемане на почвените материали от площадката, предвидена за изграждане на новото депо и съхранение на специално отредени депа, за да се използват последващо ползване на хумуса по предназначение – за възстановяване на нарушените терени
- Рекултивация на нарушените земи на територията на площадките и на нарушените прилежащи земи - съгласно проект и/или указания на възложителя.
- Складовите площи за разтвори ще се организират върху твърди настилки, като се ограничава така, че да няма разтичане върху почва.
- Ежедневно почистване на работните участъци за да се предотврати разнасяне на по - леки частици от вятъра.
- Всички отпадъци се складира на депо в контейнери.
- След приключване на обекта, всички складови площи се почистват и измиват.
- Поради това, че на обекта не се предвижда работа с опасни химически вещества, не е необходимо да се доставя контейнер за съхранение на такива.
- При транспортиране на различни видове разтвори, транспортните средства ще се пълнят под техният капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища в производствено-техническата база на обекта.
- За да не се допуска замърсяване на площи извън границите на площадката със строителни и битови отпадъци, строителната площадка се огражда с инвентарни пана.

Строителните отпадъци

- Транспортират от притежателите им до общинското депо, където се използват за запръстяване.

Намаляване на шумовото замърсяване

- Фирмата ни разполага с високо производителна ръчна техника и механизация, производство на водещи световни производители - Хилти, Бош, Вакер - основна цел на които е намаляване на вибрациите и шума на машините за по - комфортна работа с тях.
- Не се разрешава работа на машини и съоръжения в тъмната част на денонощието - разчета на времето на строителство е при 8 часов работен ден
- Не се допуска работа на строителни машини и механизация на празен ход

Радиационен фон

- Не се предвижда работа с инструменти и материали, които биха замърсили радиационния фон.

Татяна Енчева – Управител
(име и фамилия; длъжност)

гр. Русе



ДО
ИНЖ. СТОЯН ХРИСТОВ
ДИРЕКТОР НА
КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава 8^а във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: *"Ремонт и рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток"*

От Татяна Цвяткова Енчева, ЕГН 7501285378, притежаваща л.к.№ 640554302, издадена на 11.08.2010 г. от МВР гр.Русе (орган и място на издаването), в качеството си на Управител (длъжност) на „Тим Билдинг Кънстракшън Къмпани“ ЕООД (наименование на участника), ЕИК 200005355, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул. „Орлово гнездо“ №3, бл. „Лебед“, ет.1, тел.0888521374

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

След запознаване с публичната покана и документацията за участие в обществената поръчка с предмет: *"Ремонт и рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток"*, изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето **Ценово предложение** за изпълнение на поръчката, както следва:

Предлагаме обща крайна цена на консултантската услуга, предмет на настоящата поръчка:

233 986.32 (двеста тридесет и три хиляди, деветстотин одемдесет и шест лева и тридесет и две ст.) лева, без ДДС и

(изписва се цифром и словом)

280 783.58 (двеста и осемдесет хиляди, седемстотин осемдесет и три лева и петдесет и осем ст.) лева, с ДДС.

(изписва се цифром и словом)

В предложената цена са включени стойността на подлежащите на влагане материали, разходите за труд, механизация, транспорт, енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата.

Цената е получена на база твърди единични цени на видовете работи и не подлежи на промяна.

Прилагаме подробна количествено-стойностна сметка, с единични цени за отделните видове СМР, които са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация, съгласно приложени анализи за единични цени за всеки вид работа.

При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сумата.

Приложение: съгласно текста

29.02.2016 г.
(дата (dd/mm/yyyy))

гр. Русе

Татяна Епчева – Управител
(име и фамилия; длъжност)



.....
подпис на законния представител или
на надлежно упълномощено лице,
което подава офертата (и печат)

		КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА		Приложение №3	
за обект: "Ремонт и рехабилитация на есп разтоварище западно от рамнен коловоз към склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток"					
№	Видове работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	Демонтаж на ст.б. плочи от временен преход и стифирание на фигура за повторна употреба	бр.	8.00	117.22	937.76
2	Изсичане и разкрояване на единични дървета и дънери на храсти над 10 см	бр.	5.00	69.21	346.05
3	Механизирано изкорсяване на дънери и наговарване на транспорт	бр.	5.00	100.96	504.80
4	Разкопаване и натоварване отпадъци на транспорт с багер	м ³	85.00	50.48	4290.80
5	Тънък изкоп с багер на транспорт	м ³	462.00	12.95	5982.90
6	Извозване на земни маси и отпадъци до 10 км разстояние в т. ч. и такса сметище	курс	82.00	104.60	8577.20
7	Подравняване на земната основа с булдозер	м ²	1320.00	8.41	11101.20
8	Валиране на земната основа с вибровалаяк до E≥60 MPa или Id = 0.7	м ²	1320.00	3.86	5095.20
9	Преработка на съществуваща шахта	бр.	1.00	325.07	325.07
10	Доставка на трошен камък 5-75 мм до 80 км с включен транспорт	м ³	264.00	103.64	27360.96
11	Разриване на трошен камък за пласт от 20 см с булдозер	м ³	264.00	43.13	11386.32

№	Видове работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена (лв.)	Стойност (лв.)
12	Валиране с вибровалък до $E \geq 200$ МРа	м ³	264.00	38.59	10187.76
13	Полагане на полиетиленово фолио със застъпване $K=1,20$	м ²	1464.00	1.65	2415.60
14	Армировъчни столчета $\phi 10 \times 40 \times 3$ бр/м ²	кг	1807.00	1.28	2312.96
15	Доставка и монтаж на армировка Ст.АIII за плочи (N12 на карета 15/15 см)	кг	28731.00	1.31	37637.61
16	Доставка и полагане на бетон В 30 за плочи 3.00/4,00/0.20 с долна и горна армировка N12 на карета 15/15 см	м ³	244.00	182.22	44461.68
17	Стиропор 2см за фуга	м ²	14.40	7.11	102.38
18	Кофраж за бетонови настилки	м ²	148.00	19.52	2888.96
19	Битумна заливка за дилатационни фуги	м ³	0.970	1078.94	1046.57
20	Доставка и монтаж на видими бетонови бордюри 18/35/50	м	202.00	28.04	5664.08
21	Доставка и полагане на подложен бетон за бордюри В7.5	м ³	5.90	132.38	781.04
22	Направа и монтаж вътрешни плочи 147/248/13 (двойно армирани и с усилени ръбове) върху пясъчен слой	бр.	64.00	332.89	21304.96
23	Направа и монтаж външни плочи 95/248/13 (двойно армирани и с усилени ръбове) върху пясъчен слой	бр.	128.00	220.71	28250.77
24	Направа пясъчен слой (пясъчен налив) под плочи върху железен път	м ³	56.00	18.28	1023.68
			Обща стойност:		233,986.32 лв.
			20% ДДС:		46,797.26 лв.
			Обща стойност с вкл. ДДС:		280,783.58 лв.

№	Видове работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена (лв.)	Стойност (лв.)
	Съставил:				
	Управител: <i>Татяна Енчева</i> <i>т.ч.мат/</i>				



112

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13170161700000003

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА: Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060

ЗАСТРАХОВАН: Т И М БИЛДИНГ КОНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ЕООД
ЕИК: 200005355
Адрес : гр./с. РУСЕ, п. код 7020, ОРЛОВО ГНЕЗДО, №3, Вх.2, Ет.1,
представявано от ТАТЯНА ЦВЯТКОВА ЕНЧЕВА СОБСТВЕНИК И
УПРАВИТЕЛ

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Строител, Категория строежи: III

СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР: 1 година от 00:00:00 часа на 15.03.2016г. до 24:00:00 часа на 14.03.2017 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 15.03.2015 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ: 100,000.00 BGN за всяко едно събитие.
200,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

- Щети вследствие удар от транспортна или строителна техника: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Щети вследствие некачествена хидроизолация: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Други щети: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 500.00 BGN (петстотин BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 200.00 BGN (двеста BGN)

ДАНЪК ПО ЗДЗП: 4.00 BGN (четири BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: 204.00 BGN (двеста и четири BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 15.03.2016 г. 204.00 BGN в т.ч. премия 200.00 BGN и данък 4.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застрахования на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал. 1 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или невярно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 15.03.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Даниела Петрова Василева/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/Т И М БИЛДИНГ КОНСТРАКШЪН
КЪМПАНИ ЕООД/

№ 1299426

Посредник: ПП-РУСЕ - ПРИСТА НЕТ ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1000 ХРИСТО БОТЕВ, №59, ЛД № 0711005

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, ЛД № 0711005

Оригинал

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Allianz

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София 1000
ул. „Г. Бенковски“ №3
Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
ЕИК 121718407



Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212716171000002 / 18-03-2016

ПО ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ"

"ДЗИ—Общо застраховане" ЕАД, Главна агенция Русе, адрес гр.Русе, пл."Света Троица" 15 на основание платена премия и съгласно специалните условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект", приема да застрахова в рамките на лимитите, сроковете и условията на настоящата полица:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "ТИМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЕООД ЕИК: 200005355 Адрес: гр.Русе, жк. Здравии-изток, ул. Орлово гнездо №3, бл. Лебег, ет.1 Представяван от: ТАТЯНА ЦВЯТКОВА ЕНЧЕВА		
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАН:	Няма		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за причинените от него имуществени и немуществени вреди на Възложителя, други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно "Основно покритие" на приложените Специални условия за застраховане "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект".		
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ „ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ“:	Не се прилага		
РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ:	Разширено покритие „Гаранционен период“		
ЗАСТРАХОВАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи Строителен обект: "Ремонт и рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе - изток" Възложител (по смисъла на Закона за устройство на територията): Клон-териториално поделение пристанище Русе на ДППИ, ЕИК: 1303161400049		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 233,986.32 лв. Агрегатен лимит: 233,986.32 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10 % от размера на всяко обезщетение		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	19-03-2016		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	80 дни — период на проектиране и/или строителство 8 години - гаранционен период		
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 19/03/2016 г.	КРАЙ: 24:00 часа на 04/06/2024 г.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	550.00 лв.	Словом: петстотин петдесет лв.	
ДАТА:	18-03-2016 г.		
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ:	11.00 лв.		
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	561.00 лв.	Словом: петстотин шестдесет и едно лв.	
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	1. Настоящата застраховка изключва задължителната застраховка съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, сключена на доброволно ниво (с лимити на отговорност над минималните застраховални суми за дейността и съответната категория строещи) в частта ѝ над минималните задължителни нива. 2. Ако след сключване на застрахователния договор настъпят промени в		

обстоятелствата, за които Застрахователят е поставил въпрос при сключване на застраховката, включително промяна на периода на проектиране и/или строителство, Застрахованият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя съгласно т.15.2 от ОУ на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за промяна на застрахователния договор.

Предоставена ми е писмено преддоговорната информация, съгласно изискванията на закона.

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Получих, запознах се и приемам приложените Специални условия за застраховане "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект", Общите условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза „Професионална отговорност на Строителя“ които заедно с настоящата полица и попълненото от мен Заявление-Въпросник, формират застрахователния договор.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: „ДЗИ — Общо застраховане“ ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@czi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра — по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 18.03.2016, гр.Русе

За "ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД:

/подпис и печат/

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:

/име, подпис, печат/

ДУО 2000 ООД гр.гр.Русе, ул.Хр.Аспарух, 3, вх.2, ет.1 17126055 /ИМЕ,АДРЕС И СЛУЖЕБЕН УЧАСТЪК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОСРЕДНИК/



СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ

Отговорността на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект (съгл.чл.173,ал.1,ЗУТ) се застрахова съгласно общите условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и настоящите специални условия, както следва:

1. До размера на договорените лимити на отговорност и срещу премия, предплатена изцяло или частично, при договорено разсрочено плащане, "ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД, наричан по нататък "Застраховател" застрахова професионалната отговорност на Застрахования за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на Възложителя, други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност, вписана в застрахователната полица.

1.1. Застрахован по настоящите специални условия може да бъде всяко лице, упражняващо една или няколко от следните дейности:

- проектиране на инвестиционни обекти;
- оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите;
- строителен надзор;
- цялостно изпълнение на строителни обекти или на отделни строително-монтажни работи;
- технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционни проекти;
- друга дейност, която е свързана с проектирането и изпълнението на строителни обекти;

1.2. Застраховката по отношение на конкретен строителен обект изключва задължителната застраховка съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, сключена на доброволно ниво (с лимити на отговорност над минималните застрахователни суми за дейността и съответната категория строежи) в частта ѝ над минималните нива.

2. Застрахователят осигурява застрахователна защита по настоящите специални условия в различен обхват, обособен в следните покрития:

2.1. Основно покритие

2.1.1. Всички суми, които съгласно българския закон Застрахованият е длъжен да плати на увредените лица за претърпените от тях имуществени и/или неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от застрахователното събитие.

2.1.2. Съдебните разноски по дела, заведени срещу Застрахования, за установяване на отговорността му, покрити по настоящата застраховка, при условие, че Застрахователят е бил привлечен в процеса.

2.1.3. За застрахователно събитие по това покритие се счита унищожаване или увреждане на имущество (движими или недвижими вещи) и/или телесно увреждане (вкл. смърт) на физическо лице, настъпило в границите на територията на валидност на застраховката, за което срещу Застрахования е предявена писмена претенция в срока на застрахователния договор. Ако друго не е уговорено в застрахователната полица, територията на валидност на застраховката е територията на Република България.

2.2. Разширено покритие "Гаранционен период" – Основно покритие, разширено по отношение на вреди, възникнали през периода на експлоатация на строителния обект в рамките на гаранционния му период. Писмени претенции, основаващи се на това покритие, се разглеждат и покриват от Застрахователя при условие, че са предявени до един месец от изтичането на гаранционния период.

2.3. Допълнително покритие "Подизпълнители" – покрива се отговорността на Застрахования за вреди, причинени от подизпълнители или други лица, действащи от негово име, за които той отговоря съгласно закона или договора за изпълнение.

3. По тези специални условия не се покриват:

3.1. Вреди, причинени от действия, които не се включват в професионалните задължения на Застрахования или не са му възложени с договора за изпълнение на посочения в полицата строителен обект.

3.2. Когато по полицата са застраховани няколко лица, писмени претенции, свързани със:

а) телесни увреждания или смърт в резултат на злополука на работници/служители на Застрахования, на подизпълнител или на което и да е друго лице, работещо върху строителния обект или върху отделни негови части, което има качеството застрахован по полица, издадена съгласно тези специални условия.

б) пълна или частична щета върху имущество на Застрахования, на подизпълнител или на което и да е друго лице, работещо върху целия обект или върху част от него, а също и на техните работници, или върху чужди имущества, които са наети или приети за съхранение от тях, както и такива, които не се владеят от тях на законно основание.

3.3. Умишлени действия на Застрахования;

3.4. Вреди, обезщетени по условията други застраховки.

4. На базата на настоящите Специални условия може да се застрахова отговорността за рискове, записани в т.3 като изключени, при условие, че законът не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка.

5. Застраховката се сключва на база на попълнено от кандидата за застраховане Заявление-въпросник, по образец на Застрахователя.

6. Застраховката се сключва за срок, договорен между страните.

6.1. Срокът на застраховката може да обхваща периода на проектирането, периода на изпълнение на строително-монтажните работи и гаранционния период на обекта.

6.2. По искане на Застрахования срокът на застраховката може да бъде продължен. За целта Застрахованият подава писмено искане до Застрахователя и заплаща допълнителна премия.

7. Настоящите Специални условия се прилагат заедно с Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и се тълкуват съвместно.

7.1. Във всички случаи на противоречие и неясноти, настоящите Специални условия имат приоритет пред Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството". При противоречие между застрахователната полица, Общите условия и Специалните условия, сила има уговореното в полицата.

7.2. За неуредени в тези Специални условия въпроси се прилагат Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и разпоредбите на гражданското законодателство.

8. Настоящите Специални условия са неразделна част от застрахователния договор, който освен тях включва:

8.1. Заявление-въпросник;

8.2. Застрахователна полица;

8.3. Общи условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството";

8.4. Клауза за съответния вид професионална дейност

8.5. Добавъци, анекси, както и всички други документи, които са подписани от страните и носят номера на застрахователната полица.

9. В текстовете на настоящите Специални условия са използвани следните понятия:

Строителен обект - самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.

Гаранционен период – Нормативно установеният или договореният в договора за изпълнение на строително-монтажните работи срок, но не повече от 10 години, в рамките на който изпълнителят е длъжен да отстрани скрити дефекти, възникнали по отношение на приет и въведен в експлоатация строителен обект.

Настоящите Специални условия са приети с Решение на Управителния съвет на ЗПАД "ДЗИ – Общо застраховане" с протокол № 20 от 03.08.2007г. и влизат в сила от 01.10.2007г., изменени с Протокол № 5 от 02.02.2015г. и влизат в сила от 01.03.2015г., изменени с Протокол № 56 от 14.12.2015г. и влизат в сила от 27.01.2016 г.

До: **Тел. Юробанк България АД** / Unique registration number: **BORD05190441**

Канон / Branch: **ФЦ Русе - Николаевска** / Date and hour of submission: **17.03.2016 09:57**

Адрес / Address: **ул. "Николаевска" 52** / Подпис на наредителя / Signature of the sender: 

Платете на - име на получателя / Please pay to - name of the beneficiary: **ДП ПРИСТАНИЩНА ИЗФРАСТРУКТУРА** / BIC на Банката на получателя / BIC of the beneficiary bank: **CECBBGSF**

IBAN на получателя / IBAN of the beneficiary: **BG53 CECB 9790 1043 0573 01**

При банк - име на банката на получателя / At bank - name of the bank of beneficiary: **ЦЕНТР.КООПЕРАТИВНА БАНКА**

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ PAYMENT ORDER / Вид валута / Currency: **BGN** / Сума / Amount: **11 699.32**
за кредитен превод for credit transfer

Основание за превод - информация за получателя / Reason for payment - information for the beneficiary: **ГАРАНЦИЯ ПО ИЗП.ОБЕКТ РЕМОТ И РЕХ.**

Още пояснения / Additional comments: **НА ЖП РАЗТОВАРИЩЕ ТЕРМ.РУСЕ ИЗТОК**

Наредител - име / Sender - name: **Т И М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ Е**

IBAN на наредителя / IBAN of the ordering party: **BG12 BPBI 7921 1041 9328 01** / BIC на банката на наредителя / BIC of the bank of the ordering party: **BPBIBGSF**

Платежна система / Payment System: **Бисера 6** / Такси* / Fee*: **002** / Дата на изпълнение / Date of execution: **17.03.2016**

Счетоводител / Accountant: **Емилия Андонова Минева** / Комисиона / Commission: **1.20** / Курс / FX rate: **BGN 11699.32, Курс: BGN 1 / BGN 1.00**

* Такси / Fee: 1 - за сметка на наредителя / 1 - our; 2 - споделяна (стандарт за местни преводи) / 2 - share (standard for local payments); 3 - за сметка на получателя / 3 - beneficiary

Попълва се при преводи между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс
 To be filled for payments from local to foreign parties in the country and for sums equal or exceeding the sum according to article 2, paragraph 1, point 1 from Regulation No 27 of BNB for Payments statistics

Данни за наредителя / Ordering party's data: Местно лице / Local party; Чуждестранно лице / Foreign party

Данни за получателя / Beneficiary data: Местно лице / Local party; Чуждестранно лице / Foreign party

Държава на наредителя / Country of the ordering party

Държава на получателя / Country of the beneficiary

Адрес на наредителя / Address of the ordering party

Адрес на получателя / Address of the beneficiary

Описание на икономическата същност на превода / Description of the economic essence of the transfer

При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансов кредит / For transfers connected to financial credit already given from/to a foreign party / Номер на БНБ / BNS number

Известно ми е, че за посочване на неверни данни носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
 I am aware that I am responsible under article 313 from the Penal code for deliberately stating incorrect information

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**
